

SASOI ERAIKUNTZAK propone ejecutar las obras de “RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPÍN” de Aibar/Oibar dividiéndolas en tres fases.

Las obras comenzarían el miércoles 2 de marzo de 2022 y finalizarían en un plazo de 4 meses.

### **FASE 1**

La primera fase va desde la intersección de la Calle Pintor Crispin con la Travesía de Sangüesa situada en el punto bajo de la calle hasta la altura del Nº 4 de la Calle Pintor Crispin (Biblioteca o Consultorio médico).

En esta fase se realizarán los trabajos de demolición, canalizaciones y finalmente se realizan los trabajos de ejecución de las subbases y bases (Zahorra artificial).

Duración estimada: 1 mes y tres semanas.


### **FASE 2**

Desde el portal Nº4 de la Calle Pintor Crispin hasta la parte alta de esta calle.

En esta fase se realizarán los mismos trabajos que en la fase anterior (Demoliciones, canalizaciones y ejecución de las subbases y bases (Zahorra artificial)).

Duración estimada: 1 mes y 1 semana.

En la siguiente imagen vemos cuales serían las dos primeras fases.

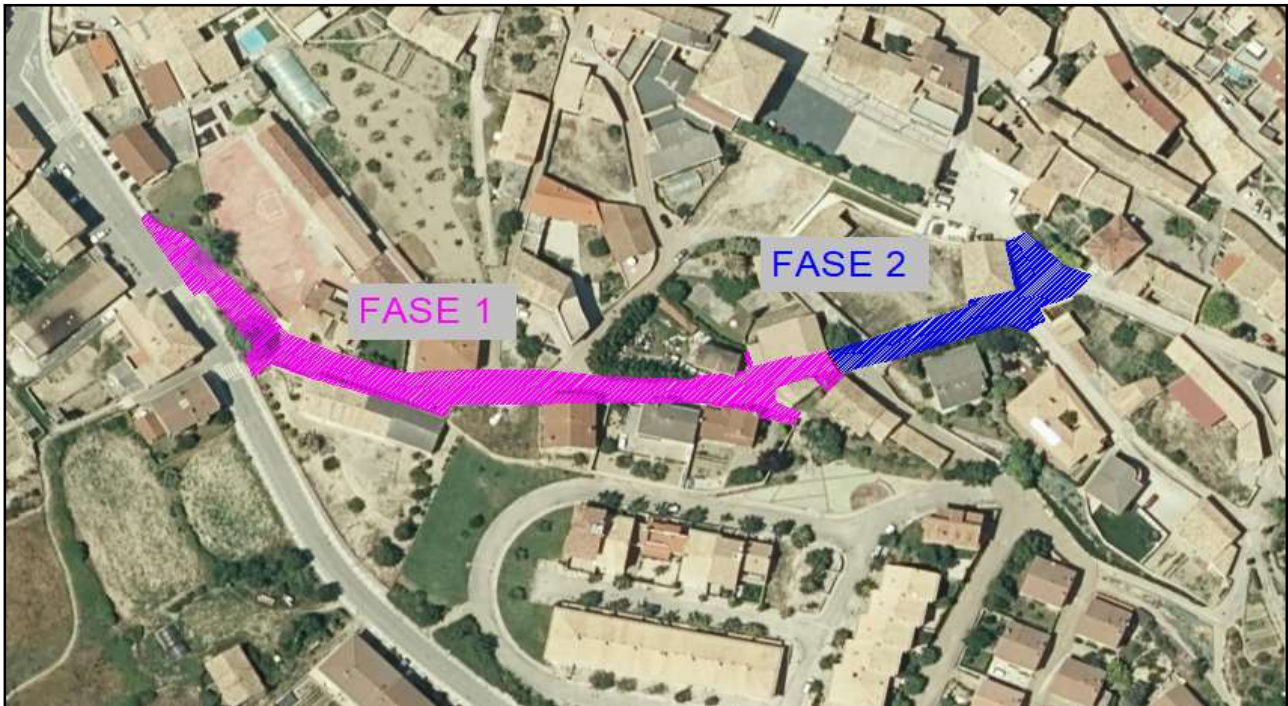


**FASE 3**

Finalmente en la fase final se realizarán los trabajos de pavimentación de toda la calle comenzando en la parte alta y bajando hacia la intersección con la Travesía de Sangüesa tal y como se observa en la siguiente imagen.

Duración estimada: 1 mes.



En la siguiente imagen podemos observar gráficamente el plan de obra planteado por SASOI:

		PLAN DE OBRA: "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINTOR CRISPÍN" de Aibar/Oibar.															
		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
<b>1ª FASE (1 MES Y 3 SEMANAS)</b>																	
DEMOLICIONES																	
CANALIZACIONES																	
SUBBASES Y BASES																	
<b>2ª FASE (1 MES Y 1 SEMANA)</b>																	
DEMOLICIONES																	
CANALIZACIONES																	
SUBBASES Y BASES																	
<b>3ª FASE (1 MES )</b>																	
PAVIMENTACIONES																	
G.RESIDUOS+CONTROL CALIDAD+SEG. Y SALUD																	
